

一般国道253号・赤倉大橋リニューアル工事 かわら版 No.2


令和8年7月

令和8年5月11日から一般国道253号を全面通行止めにして実施している赤倉大橋リニューアル工事について、現在、床板の取替作業を進めています。皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、引き続き、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

■床版取替作業全景■



■工事進捗状況■

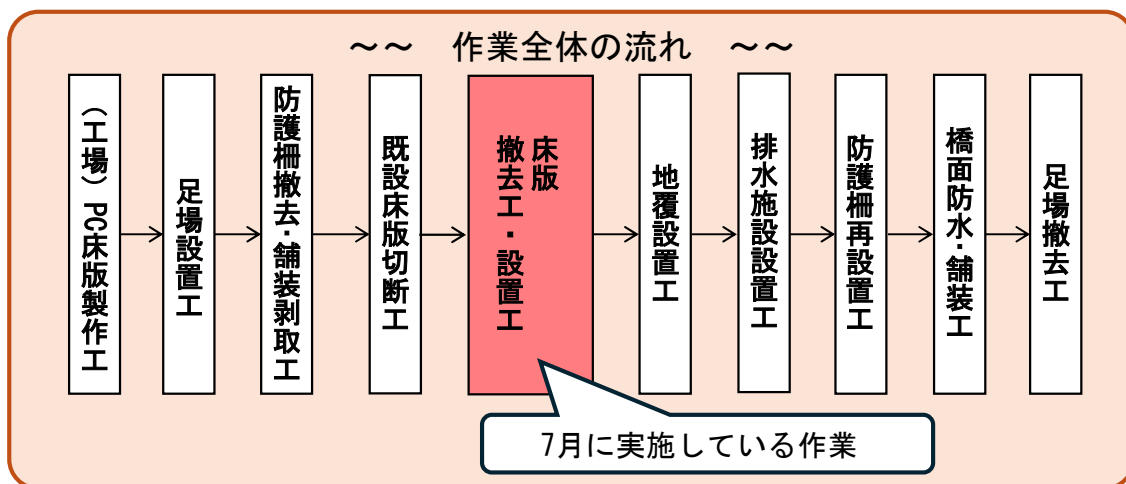

- 7月上旬からクレーンを2基設置して、既設床板を撤去し、工場製作したプレキャストPC床版を据え付ける作業を実施しています。作業は橋中央から始め、両端へ移動していきます。
- 既設床版は、縦約2m×横約4.6mの大きさに切断・分割し、クレーンで吊り上げて撤去します。
- プレキャストPC床板は、縦約1.7m×横約9mの大きさがあり、1日当たり4枚設置するペースで作業を進めています。（据付作業は8月上旬完了予定）

■床版取替作業の流れ■




床版撤去の準備作業

- 床版をクレーンで吊り上げられる大きさにするため、カッターで切断し分割します。



分割した床版の撤去作業

- 分割した床版を橋桁から剥がし、クレーンで吊り上げ撤去しています。

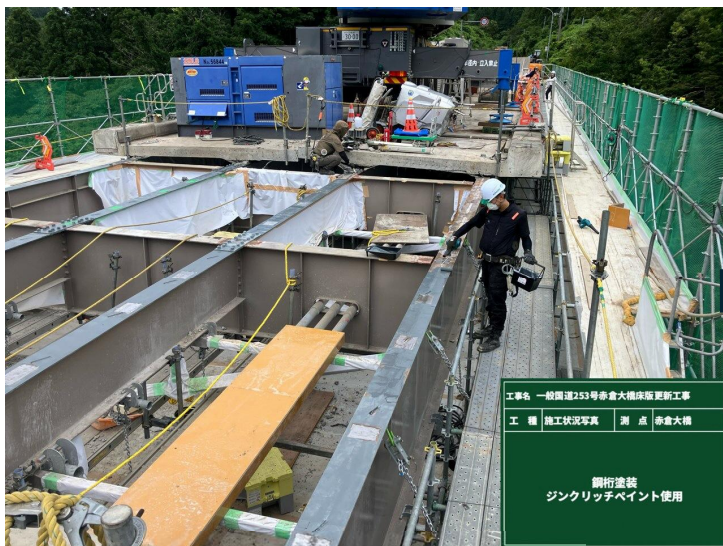


床版を設置する準備作業

- 床版を撤去した後の橋桁の表面に塗装して、防錆処理を行っています。



床版を据え付ける前の状況

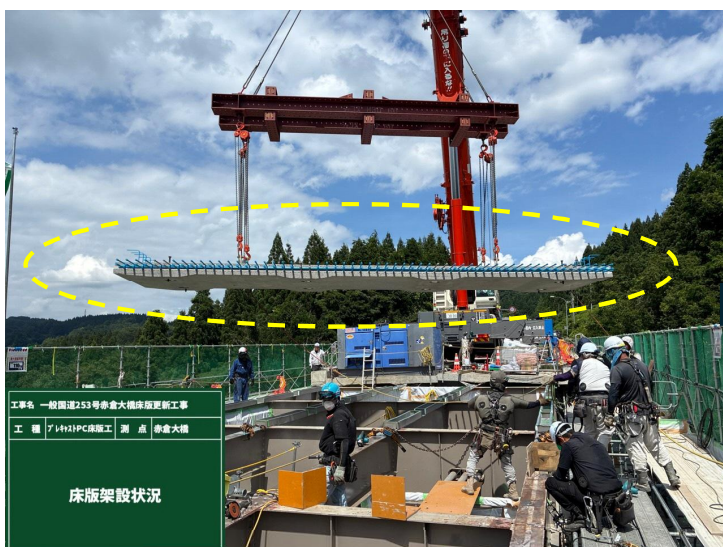

床版を据え付ける作業

- プレキャストPC床版をクレーンを用いて据え付ける作業を行っています。



床版を据え付け終わった状況
