

12

43号 中ノ口川 本復旧 堤防亀裂 新潟市西区大野町

延長：左岸 93.0m
施工者：(株)加賀田組


実施中

着手前



令和6年3月15日 対岸から全景を望む

施工中

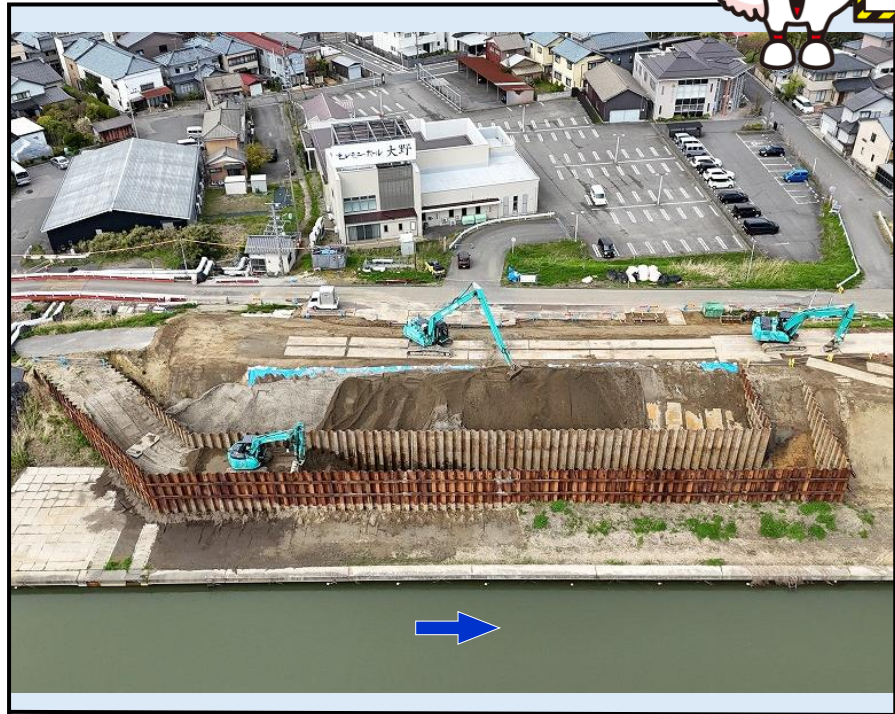

令和8年4月16日 上空から全景を望む

被害の詳細

堤防基盤が液状化したことで堤体が不均一に沈下。それにより亀裂が発生。(深さ2.5m以上)

地震による液状化の発生を防止するため、地盤改良が完了。現在は築堤も完了し、仮の堤防を撤去中。

