

# 一般国道253号・赤倉大橋リニューアル工事 かわら版 No.1

令和8年6月

一般国道253号・赤倉大橋の老朽化に伴うリニューアル工事について、老朽化の状況及び工事の進捗状況をお知らせしていきます。

工事期間中、皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

## ■ 赤倉大橋の概要 ■



橋 長：145.0m  
幅 員：9.2m(車道2@4.0m、地覆2@0.6m)  
竣 工：昭和58年(1983年)  
上部形式：鋼鈹桁上路2ヒンジアーチ橋  
下部形式：逆T式橋台2基、重力式橋脚2基、  
壁式橋脚1基



## ■ 老朽化の状況 ■

▷車の荷重を直接支える床版に「ひび割れ」「土砂化」「鉄筋腐食」の損傷が発生

- 【損傷の原因】
- ・大型車の通行が多く、頻繁に通ることによる床板の疲労
  - ・冬期間のスリップ防止のため散布する凍結防止剤による塩害

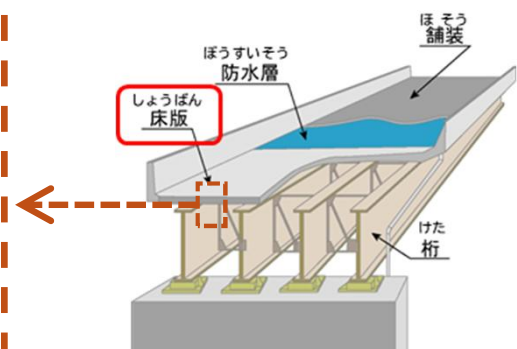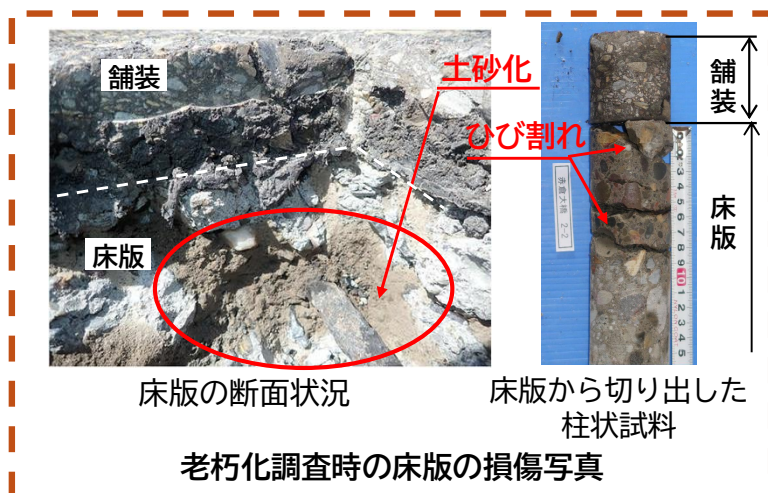

## ■工事の内容■

- ▷ 損傷した床版をより耐久性の高いプレキャストPC床板※に取替えます。
- ▷ 令和8年5月11日から令和8年12月31日(予定)の間、終日全面通行止めによる短期間集中工事を行います。
- ※床版を工場製作することにより、耐久性が優れ、現地作業期間が短縮化されます。

## ■進捗状況■



- ・床版取替工事のための足場を設置しています。



- ・舗装版を削り取る切削機により、舗装を剥いています。



- ・床版の表面に多数の土砂化や腐食した鉄筋が確認されました。



- ・床版を部分的にカッターで切断し、床版を撤去する準備をしています。
